

Reporte operacional de perforación

Datos generales

Fecha turno	2026-05-19	Turno	Noche
Área operacional	Proyecto DES	Total equipos registrados 6	
Validación equipos	Todos registrados		

Detalle por equipo

Equipo	Estatus operacional	Operador	Ubicación	Perforación	Producción	Horas	KPI	Acero
Sandvik D75KS 9245	Operativo parcial	Jonathan Leiva Código: M-8086	Banco: Malla: 203 Fase: 2	Tipo: Producción Terreno: Blando, Compacto, Competente, Estable	Metros: 564.60 Pozos: 30 Horómetro: 14478.0 - 14489.0 Motor: 11.00	Efectivas: 10.00 Avería: 0.00 No efectivas: 2.00	Rend.: 56.46 Disp.: 100.00% Util.: 83.33%	Tricono
Sandvik D75KS 9277	Operativo parcial	Carlos Rondon Código: M-2036	Banco: 2328, 2296 Malla: 203, 113 Fase: 1, 2	Tipo: Producción Terreno: Blando, Competente, Estable	Metros: 349.40 Pozos: 17 Horómetro: 18342.0 - 18353.0 Motor: 11.00	Efectivas: 8.50 Avería: 0.00 No efectivas: 3.50	Rend.: 41.11 Disp.: 100.00% Util.: 70.83%	Tricono
FlexiROC D65 9259	Operativo parcial	Matías Toro Código: M-204167	Banco: 2296 Malla: 109, 113 Fase: 1	Tipo: Buffer 1, Buffer 2 Terreno: Competente, Compacto, Medio	Metros: 203.10 Pozos: 12 Horómetro: 16857.0 - 16864.0 Motor: 7.00	Efectivas: 6.25 Avería: 4.25 No efectivas: 1.50	Rend.: 32.50 Disp.: 64.58% Util.: 52.08%	Bit
FlexiROC D65 9272	Operativo parcial	Mauricio Mora Código: M-9939	Banco: 2376 Malla: 239 Fase: 2	Tipo: Producción Terreno: Fracturado, Inestable, Relleno, Blando	Metros: 56.50 Pozos: 5 Horómetro: 24307.0 - 24313.0 Motor: 6.00	Efectivas: 3.25 Avería: 3.75 No efectivas: 5.00	Rend.: 17.38 Disp.: 68.75% Util.: 27.08%	Bit 770025-34
FlexiROC D65 9274	Operativo sin marcación	Jhan Calderon Código: M-9464	Banco: Malla: Fase:	Tipo: Terreno:	Metros: 0.00 Pozos: 0 Horómetro: 0.0 - 0.0 Motor: 0.00	Efectivas: 0.00 Avería: 0.00 No efectivas: 12.00	Rend.: 0.00 Disp.: 0.00% Util.: 0.00%	Bit 770025-32
SmartROC D65 9339	Operativo parcial	Nicolas Torres Código: M-9698	Banco: 2376 Malla: 239 Fase: 2	Tipo: Producción Terreno: Fracturado, Inestable, Relleno	Metros: 56.50 Pozos: 5 Horómetro: 24307.0 - 24313.0 Motor: 6.00	Efectivas: 3.25 Avería: 3.75 No efectivas: 5.00	Rend.: 17.38 Disp.: 68.75% Util.: 27.08%	Bit 8885850-048



Resumen del turno

Metros totales perforados	1230.10	Horas efectivas totales	31.25
Horas de avería totales	11.75	Horas no efectivas totales	29.00
Rendimiento consolidado	39.36 m/h	Disponibilidad promedio	67.01%
Utilización promedio	43.40%	Equipos faltantes	Ninguno


Resumen por estatus operacional

Estatus operacional	Detalle equipos
Operativo parcial 5 equipos	- Sandvik D75KS 9245 - Sandvik D75KS 9277 - FlexiROC D65 9259 Con avería: Sí Horas avería: 4.25 Tipo detención: Cambio Turno, Colación, Avería mecánica - FlexiROC D65 9272 Con avería: Sí Horas avería: 3.75 Tipo detención: Cambio Turno, Traslado, Avería mecánica, Otros - SmartROC D65 9339 Con avería: Sí Horas avería: 3.75 Tipo detención: Cambio Turno, Avería mecánica, Traslado, Otros
Operativo sin marcación 1 equipos	FlexiROC D65 9274


Gráficos operacionales

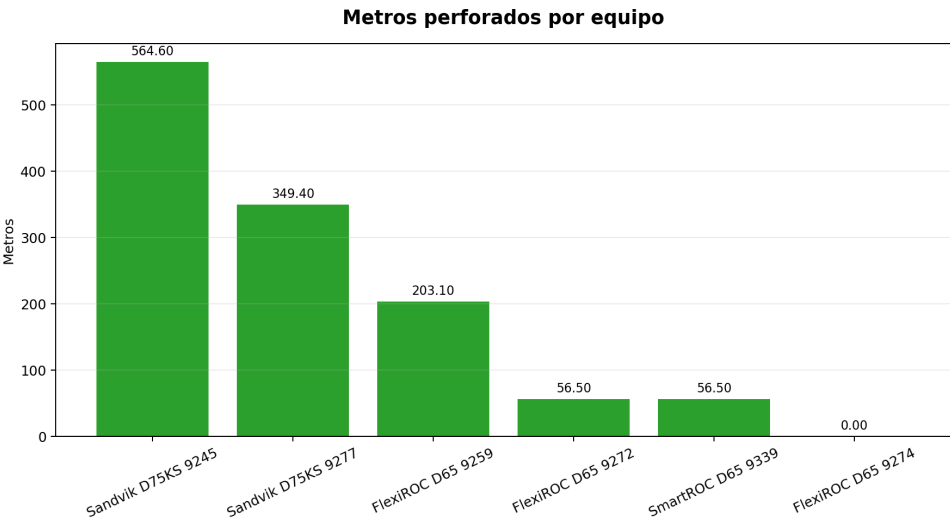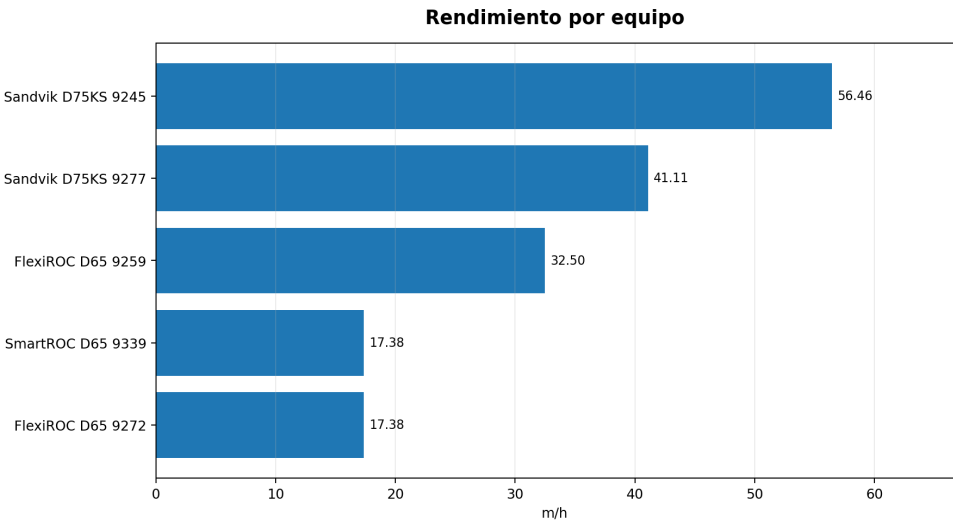

Distribución de horas del turno

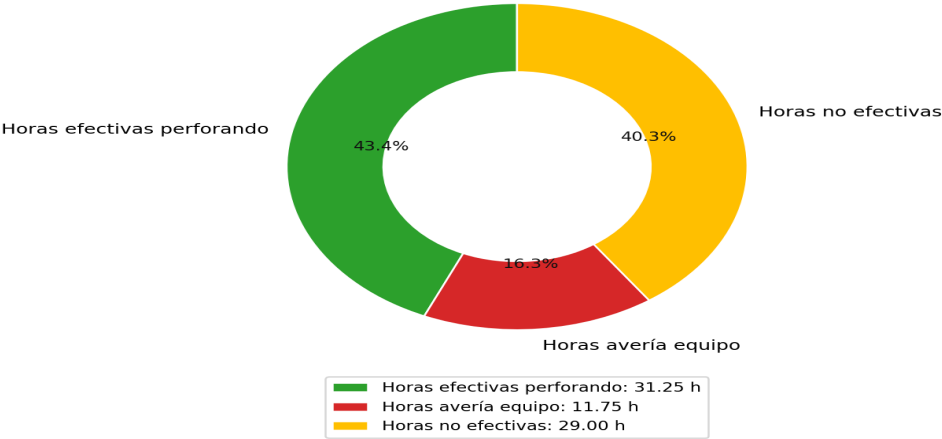

Estatus operacional de equipos

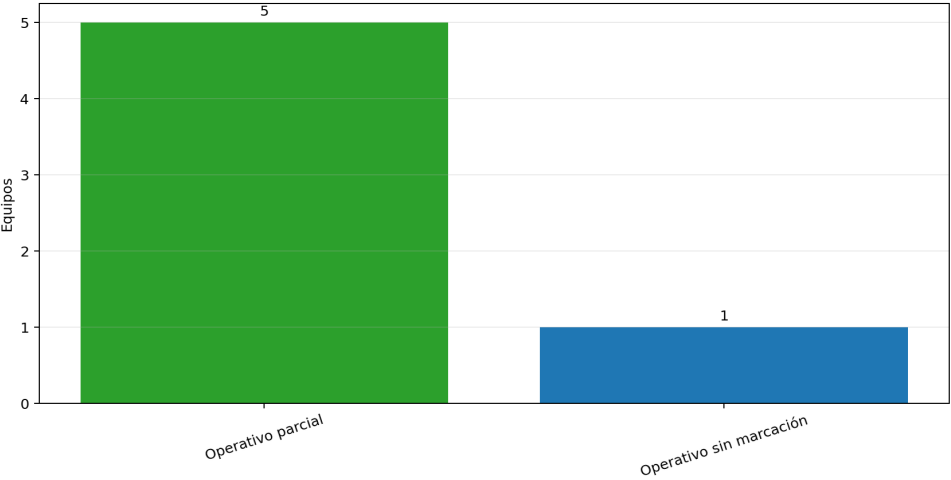

Disponibilidad y utilización promedio por equipo

