

REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

Fecha	21-05-2026	Turno	Noche
Proyecto	Proyecto DES	Equipos registrados	6
Rendimiento consolidado	36.53 m/h	Generado	22-05-2026 10:12

METROS PERFORADOS 1,041.20 Producción total	RENDIMIENTO 36.53 m/h Consolidado	DISPONIBILIDAD 100.00% Promedio turno	UTILIZACIÓN 39.59% Promedio turno	EQUIPOS REGISTRADOS 6/6 Reportados en turno
CON MARCACIÓN 5 Equipos con datos	STANDBY TAJO/PATIO 1 Disponibles sin producción	H. NO EFECTIVAS 43.50 Distribución turno	H. AVERÍA 0.00 Mecánica	

Análisis breve del turno

Turno Noche del 21-05-2026: producción total 1,041.20 m, rendimiento consolidado 36.53 m/h. La principal causa de detención fue Standby por falta de tajo/patio (30.25 h). Se registran 5 equipos con marcación y 1 equipos en standby por falta de tajo/patio. El tiempo no efectivo representa una restricción relevante para la utilización.

Resumen operacional

Indicador	Valor
Metros perforados	1,041.20
Pozos perforados	57
Petróleo litros	2,069.00
Horas efectivas	28.50

Categoría	Horas
Horas efectivas perforando	28.5
Falla Operacional	0
Cambio de aceros	0.0
Seguridad	0
Relleno de agua	1.5
Combustible	0.25
Traslado	2.25
Cambio Turno	4.5
Standby por falta de tajo/Patio	30.25
Tronadura	0
Falta operador	0
Otros	3.25


KPI	Valor
Rendimiento m/h	36.53
Disponibilidad promedio	100.00%
Utilización promedio	39.59%
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	43.50

Detalle compacto por equipo

Modelo	N°	Operador	Estado	Metros	Pozos	Rend. m/h	H. efect.	H. no efect.	H. avería	Disp. %	Util. %	Marcación
Sandvik D75KS	9245	Jonathan Leiva	Operativo parcial	391.90	19	65.32	6.00	6.00	0.00	100.00	50.00	Con marcación
Sandvik D75KS	9277	Valeria Millan	Operativo parcial	374.40	20	34.04	11.00	1.00	0.00	100.00	91.67	Con marcación
SmartROC D65	9339	Nicolas Torres	Operativo parcial	18.00	2	9.00	2.00	10.00	0.00	100.00	16.67	Con marcación
FlexiROC D65	9274	Jhan Calderon	Operativo	0.00	0	0.00	0.00	12.00	0.00	100.00	0.00	Standby por falta de tajo/Patio
FlexiROC D65	9272	Mauricio Mora	Operativo parcial	25.60	2	34.13	0.75	11.25	0.00	100.00	6.25	Con marcación
FlexiROC D65	9259	Matías Toro	Operativo parcial	231.30	14	26.43	8.75	3.25	0.00	100.00	72.92	Con marcación

Gráficos operacionales resumidos

Pareto de detenciones por horas

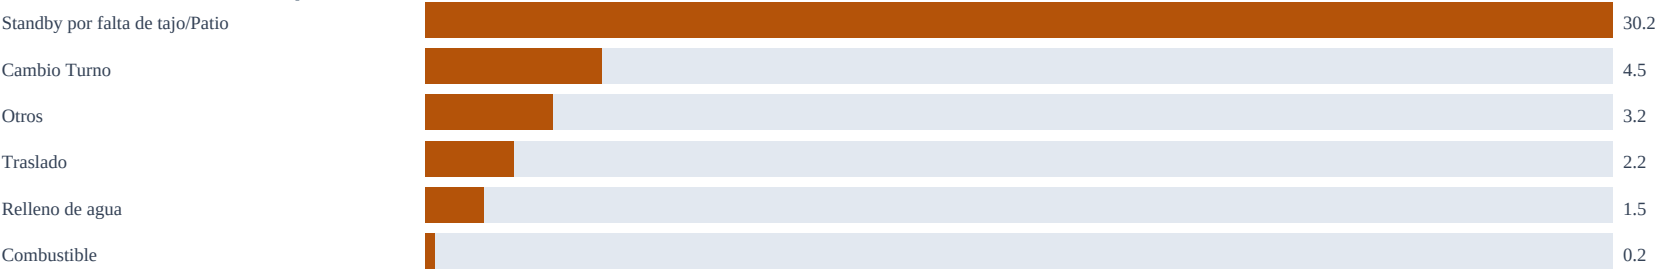

Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS
Equipo 9245

Operativo parcial

Operador	Jonathan Leiva
Marcación	Con marcación
Metros perforados	391.90
Pozos perforados	19
Rendimiento m/h	65.32
Disponibilidad	100.00%
Utilización	50.00%
Horas efectivas	6.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	6.00



Sandvik D75KS
Equipo 9277

Operativo parcial

Operador	Valeria Millan
Marcación	Con marcación
Metros perforados	374.40
Pozos perforados	20
Rendimiento m/h	34.04
Disponibilidad	100.00%
Utilización	91.67%
Horas efectivas	11.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	1.00

KPI operacional por equipo



SmartROC D65
Equipo 9339

Operativo parcial

Operador	Nicolas Torres
Marcación	Con marcación
Metros perforados	18.00
Pozos perforados	2
Rendimiento m/h	9.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	16.67%
Horas efectivas	2.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	10.00



FlexiROC D65
Equipo 9274

Operativo

Operador	Jhan Calderon
Marcación	Standby por falta de tajo/Patio
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	12.00

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65
Equipo 9272

Operativo parcial

Operador	Mauricio Mora
Marcación	Con marcación
Metros perforados	25.60
Pozos perforados	2
Rendimiento m/h	34.13
Disponibilidad	100.00%
Utilización	6.25%
Horas efectivas	0.75
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	11.25



FlexiROC D65
Equipo 9259

Operativo parcial

Operador	Matías Toro
Marcación	Con marcación
Metros perforados	231.30
Pozos perforados	14
Rendimiento m/h	26.43
Disponibilidad	100.00%
Utilización	72.92%
Horas efectivas	8.75
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	3.25
